PMO SUMMIT 2026

Governança de riscos que *funciona*

Ponto de virada para sair da matriz de riscos engavetada: as decisões que protegem o portfólio.

- Luiz Fernando Castilho

O TELEFONE TOCA

Terça-feira, 9h.

O governo federal sinaliza restrição orçamentária.
Nenhum número. Só o sinal.

> **Às 10h, a diretoria pergunta ao titular do PMO: “o que a gente protege?”**
>
> *Resposta até sexta.*

O TELEFONE TOCA

A estante



MATRIZ DE RISCOS · ARQUIVADA

Feita. Aprovada. Arquivada.

Ninguém abre desde a auditoria.

Essa é a história de hoje: o que ela fez em três dias, e por que, na maioria das organizações, essa história não acontece.

O TELEFONE TOCA

Para que trabalho a matriz foi contratada?

QUANDO o governo sinaliza um corte e a diretoria me dá três dias para dizer o que proteger,

QUERO saber quais processos não podem parar e quais projetos os sustentam,

PARA QUE o corte caia onde há menos impacto.

> A matriz da estante foi contratada com outro propósito: passar na auditoria.
>
> **A que funciona foi contratada para este.**

O TELEFONE TOCA

Se esse ofício chegasse hoje na sua mesa, o que você abriria *primeiro*?

A planilha de orçamento? O portfólio? A matriz de riscos?

O TELEFONE TOCA


A tese



O caso é da ANTT. Mas a ANTT aqui vale por qualquer organização com essas três coisas. **Se a sua tem, a história é sua.**

O QUE JÁ ESTAVA ESCRITO

Cinco coisas já estavam ligadas

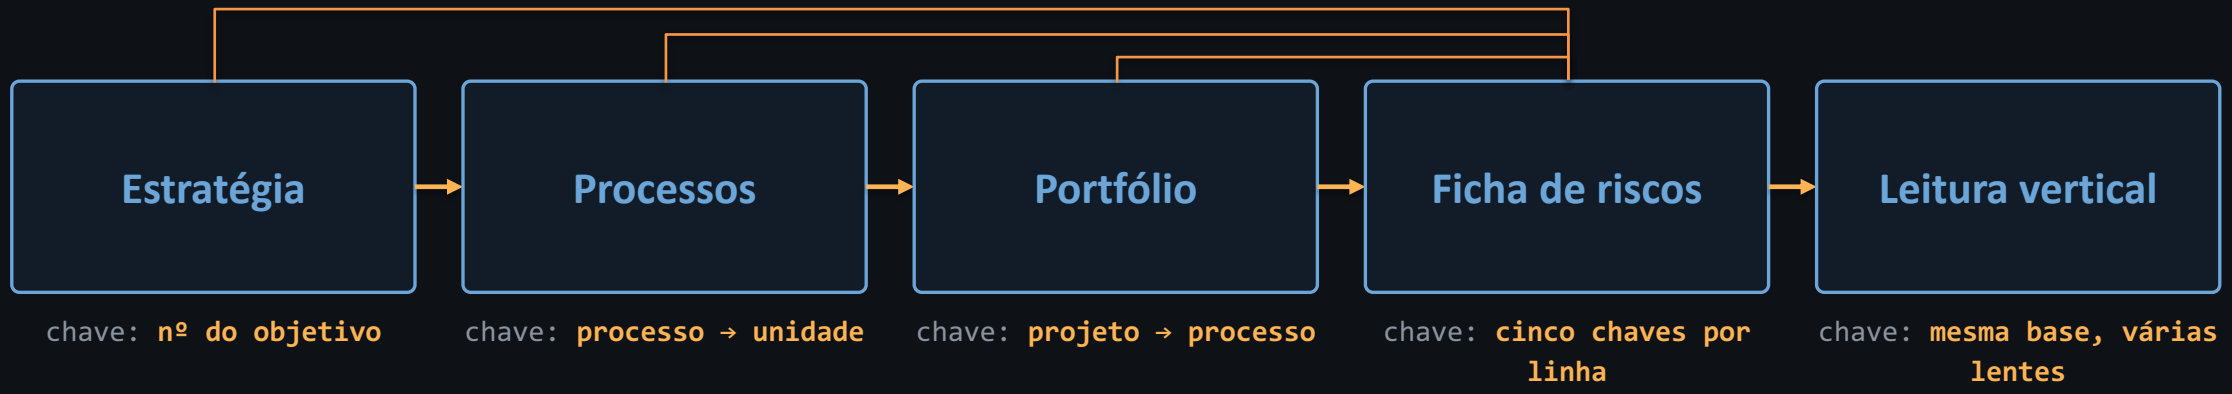

Cada elo só existe porque o anterior tem um código que o seguinte pode apontar.

A matriz que funciona é a que aponta para os outros quatro.

O QUE JÁ ESTAVA ESCRITO · ELO 1

A estratégia tem endereço

Estratégia → Processos → Portfólio → Ficha de riscos → Leitura vertical

chave do elo: nº do objetivo



Mapa Estratégico da ANTT 2024-2030: quatro perspectivas, dezessete objetivos numerados.

OE 10 processos organizacionais com foco em valor

OE 17 uso racional dos recursos e execução do orçamento: onde o ofício bate primeiro


Na sua casa: BSC, OKR, mapa. O nome não importa; o código, sim.

O QUE JÁ ESTAVA ESCRITO · ELO 2

Todo processo tem dono

Estratégia → **Processos** → Portfólio → Ficha de riscos → Leitura vertical

chave do elo: processo → unidade

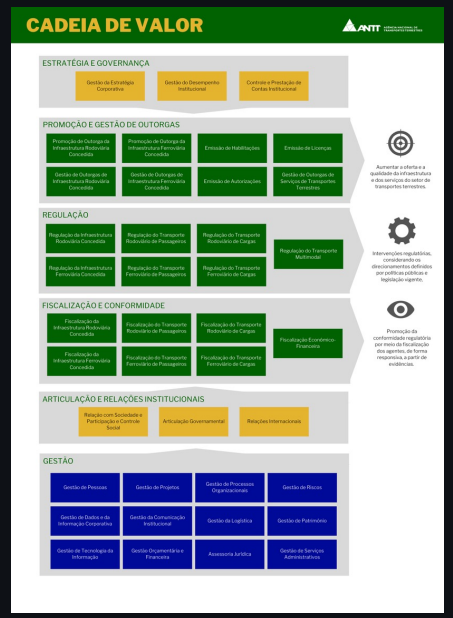

Grupo + código
ex.: finalístico · 2.3.1

Unidade responsável
a superintendência dona

Objetivo do processo
distinto do objetivo estratégico

A cadeia de valor organiza os macroprocessos; a arquitetura de processos dá a cada processo esses três campos.

Na sua casa: cadeia de valor, mapa de processos, catálogo de serviços.

O QUE JÁ ESTAVA ESCRITO · ELO 3

Onde o dinheiro aparece



chave do elo: projeto → processo

PLANO ESTRATÉGICO objetivos numerados

PLANO DE GESTÃO ANUAL projetos e ações, com meta e cronograma

PROJETO DE MELHORIA aponta para um processo e para um objetivo

O QUE JÁ ESTAVA ESCRITO · ELO 4

A ficha de risco nasce ligada

Estratégia → Processos → Portfólio → **Ficha de riscos** → Leitura vertical

chave do elo: cinco chaves por linha

FICHA DO PROCESSO · ANTES DO PRIMEIRO RISCO

Processo (grupo + código)	P__
Macroprocesso	MP__
Objetivo estratégico	OE __
Unidade dona	U_

1. **ficha**
2. escopo e SWOT
3. EAR (nó do risco)
4. NRI = P × I
5. NRR = NRI × controle
6. resposta

Cada linha de risco nasce sabendo o processo, a unidade, o macroprocesso, o objetivo e o nó da EAR. **Cinco chaves.**

O QUE JÁ ESTAVA ESCRITO · ELO 5 · A IDEIA CENTRAL

Leitura vertical: a mesma base, várias lentes



A matriz engavetada é a que só sabe responder por processo. Mesma tabela; muda só o campo de agrupamento. Nada é coletado de novo.

O QUE JÁ ESTAVA ESCRITO · DUAS LEITURAS

Incidência e impacto ficam separados

LEITURA 1 · INCIDÊNCIA

Quantos riscos estão acima do limite de tolerância.

Diz quanto piorou.

≠

LEITURA 2 · IMPACTO

Quanto dói se o evento acontecer, processo a processo.

Diz onde dói.

Regra que adotei: nenhum índice único.

O titular do PMO vai precisar das duas informações na sexta, e elas dizem coisas diferentes.

A SEMANA DA DECISÃO · TERÇA

O risco já estava escrito, em três registros

CATÁLOGO ESTRATÉGICO DO PGR

capacidade limitada em recursos orçamentários e financeiros

nível estratégico

EAR · EVENTOS EXTERNOS

contingenciamento orçamentário

a causa

EAR · ORÇAMENTO


ausência não programada de recursos

o efeito, avaliado em cada processo

Ela não abriu uma coleta. Abriu um filtro: o evento orçamentário, uma linha por processo. Não houve surpresa; houve catálogo.

A SEMANA DA DECISÃO · QUARTA · PASSO 1

Só a probabilidade muda

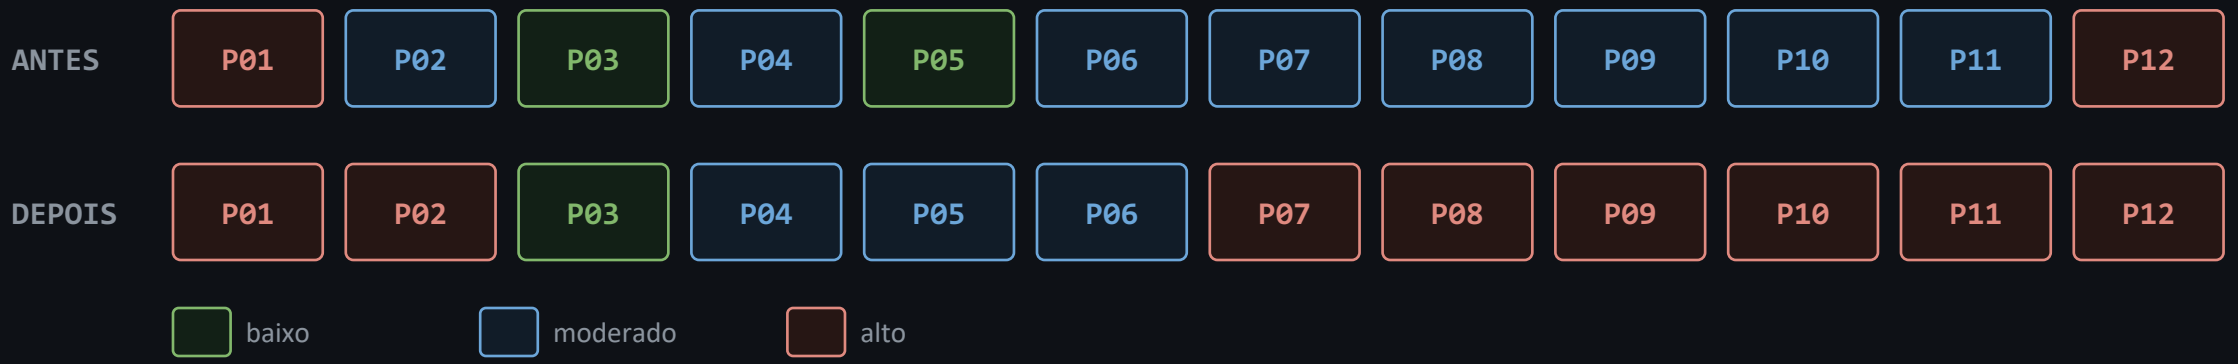

Impacto e controles não mudam. A probabilidade do evento orçamentário sobe em todos os processos; a incidência da organização sobe junto.

> **A incidência diz “piorou”. Não diz “onde cortar”.** Quem decide só por ela decide por volume.

A SEMANA DA DECISÃO · QUINTA · PASSO 2

O impacto não mudou, e é ele que separa




Quatro processos não podem parar: três finalísticos e um de suporte. O impacto é o mesmo antes e depois do ofício: estava na ficha desde o início.

> **O impacto é o que separa.**

A SEMANA DA DECISÃO · QUINTA · PASSO 3

Cruzar com o portfólio, e a lacuna

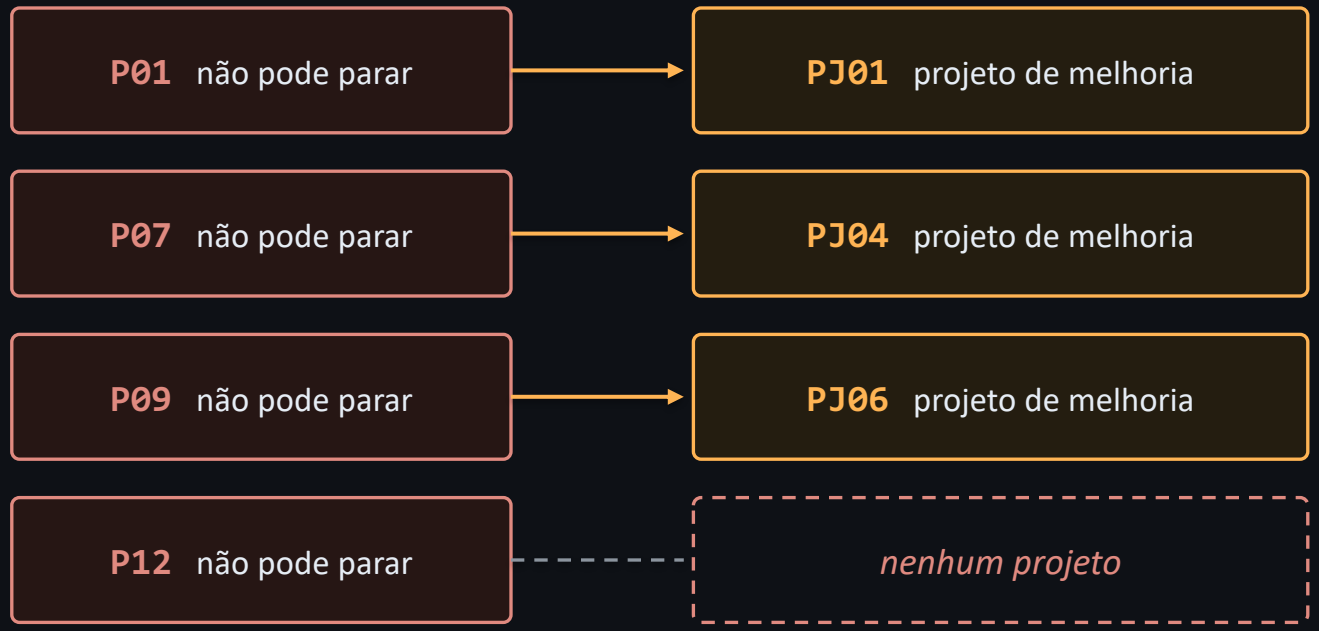

Três projetos sustentam processos críticos: **não podem parar.**

Um processo crítico não tem projeto nenhum: **a lacuna.**

A leitura não serviu só para proteger. Mostrou onde ninguém está investindo. **Isso não estava em nenhuma pauta.**

A SEMANA DA DECISÃO · SEXTA · PASSO 4

Decidir

1. **Os processos críticos não param.** São os de maior impacto; o ofício não mudou isso.
2. **Os projetos que os melhoram não param.** Cortar a melhoria de um processo crítico é cortar a saída da crise.
3. **O corte recai no restante.** E ela prepara a conta que a diretoria vai pedir.

A SEMANA DA DECISÃO · SEXTA · A VIRADA

Mesma economia, dois cortes



A · corte linear

igual para todos; atinge o que não pode parar



B · orientado por risco

zero nos protegidos; mais fundo no restante

A economia é a mesma nos dois, por construção.

O corte linear é cego ao risco: trata o processo que não pode parar como qualquer outro.

O corte orientado não é indolor; é dirigido. **Decidiu o impacto.**

A SEMANA DA DECISÃO · A VIRADA

Nenhum dado novo foi coletado: vínculos que já estavam na ficha e uma leitura que *ninguém* fazia.

EPÍLOGO

Contratado dois anos antes

QUANDO o governo sinaliza um corte e a diretoria me dá três dias para dizer o que proteger,

QUERO saber quais processos não podem parar e quais projetos os sustentam,

PARA QUE o corte caia onde dói menos, e não onde a organização se apoia.

1. Cada risco aponta para um processo?
2. Cada processo tem dono e objetivo estratégico?
3. Cada projeto aponta para um processo?

> **Três sins:** a leitura vertical já é possível; falta alguém encarregado.
>
> **Um não:** ali está o próximo trabalho do PMO.

EPÍLOGO

O que falta é a *leitura*

O Decreto 9.203/2017 pede a integração em todos os níveis desde 2017. O que falta raramente é norma.

> **A matriz de riscos que funciona não é a mais completa. É a que alguém abre quando o telefone toca.**

CONTATO

Obrigado.

Luiz Fernando Castilho

Diretor de Governança e Gestão Estratégica

Secretaria de Relações Institucionais · Presidência da República

PMP Project Management Professional

PMI-RMP Risk Management Professional

PRINCE2 7 Practitioner

C31000 ISO 31000 Risk Management

CBPP Business Process Professional

HCMP 3G Expert Professional

HCMBOK 3G Practitioner

luizcastilho.com
